


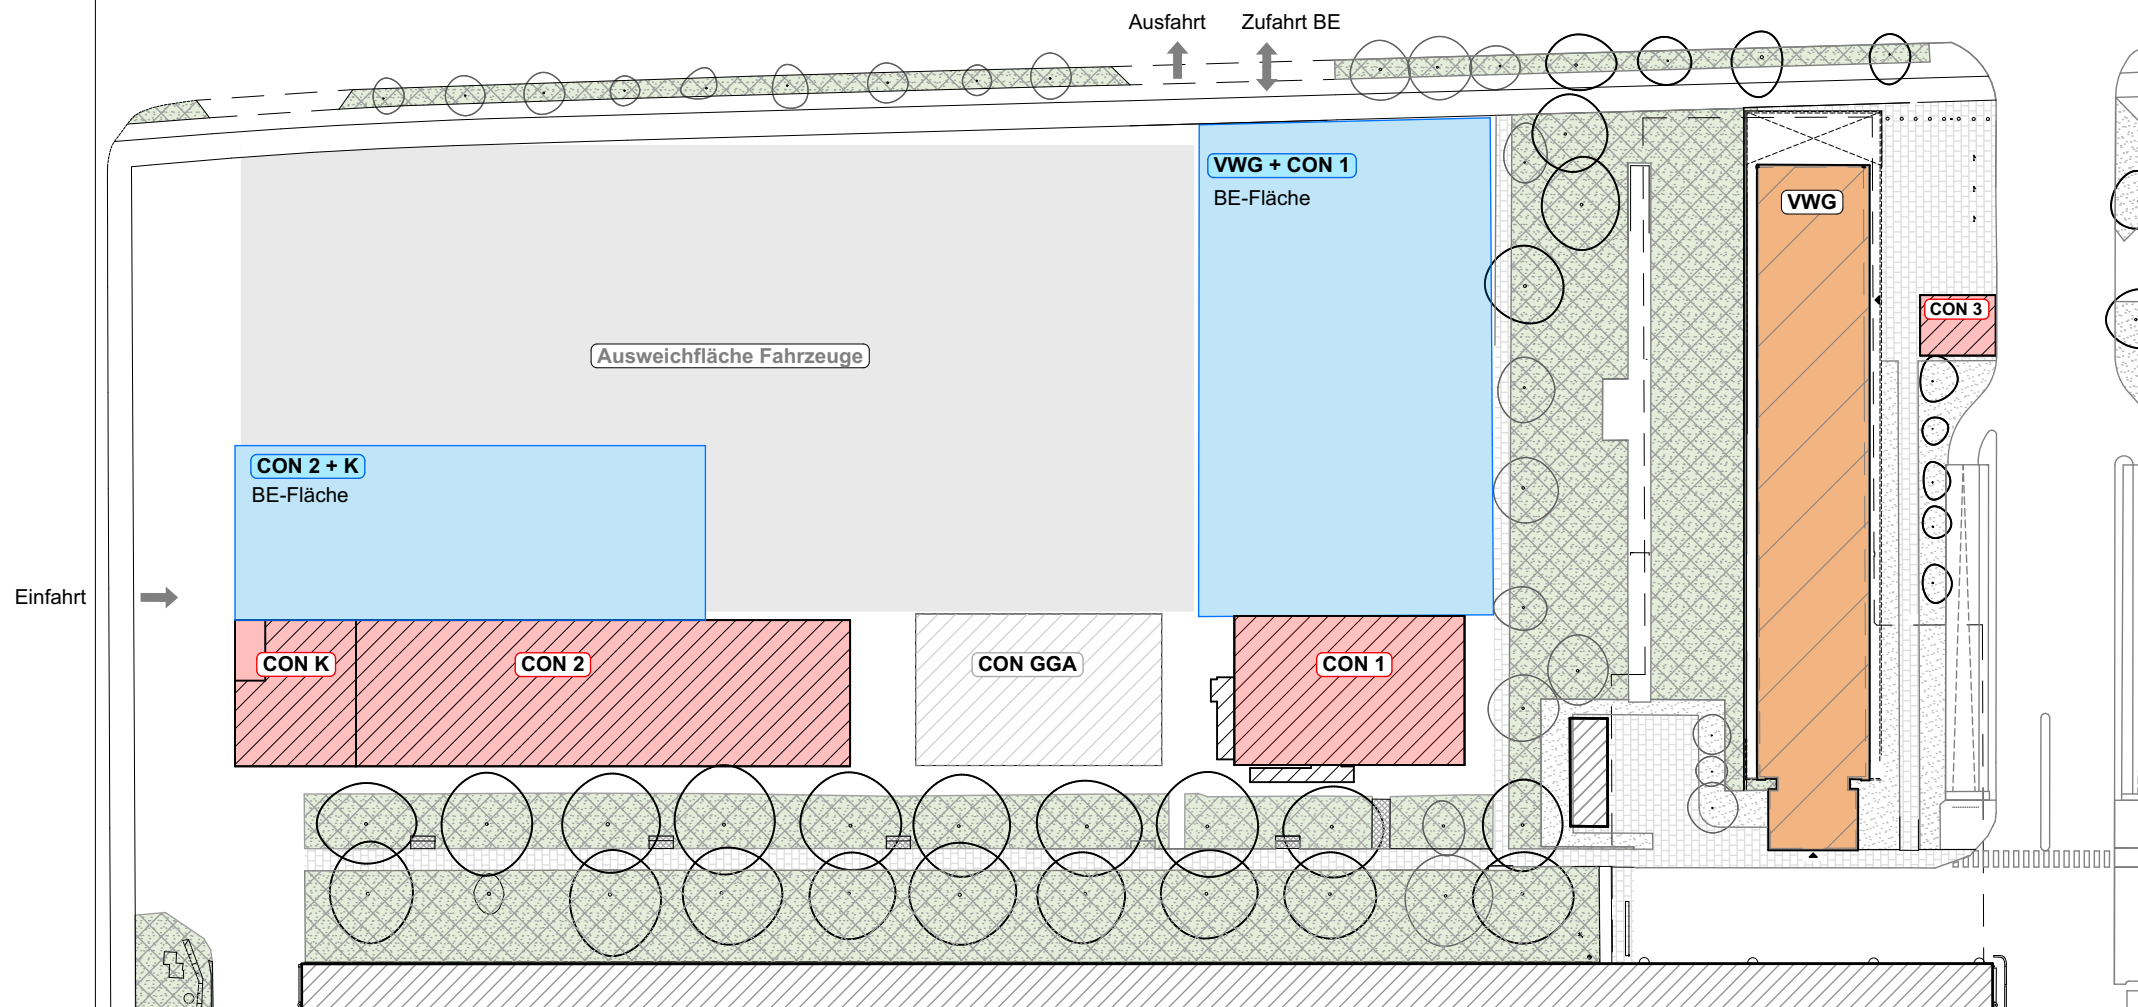

Interimslösungen AWM

- CON 1** Container 1 Astrid-Lindgren-Straße (ALS)
BA 1+2+3 - Standzeit: ca. 5+Jahre
- CON 2** Container 2 Büro
BA 1+2+3 - Standzeit: ca. 2,5Jahre
- CON K** Container K Interimsküche
BA 1+2 - Standzeit: ca. 18 Monate
- CON 3** Container 3 Anmeldung
BA 1+2 - Standzeit: ca. 18 Monate

CON GGA Nicht Bestandteil der Maßnahme,
Errichtung in 2026

Baustelleneinrichtungsflächen

- VWG + CON 1**
BE-Fläche Verwaltungsgebäude
+ Container 1 ALS
Standzeit bis Ende Baumaßnahme
- CON 2 + K**
BE- Fläche Container 2
+ Container K Interimsküche
temporäre Standzeit während
Auf-/ Rückbau CON 2 + K

Sanierungsmassnahme

- VWG** Verwaltungsgebäude
Brandschutzsanierung
+ Teilmodernisierung
Dach- und Fassadensan. 8.OG
