


## Feuerwehr- und Rettungsschule München, Bau - Maßnahmen zum Erhalt einer durchgehenden Ausbildung


FRSM Prio „Top 3“	Auslöser / Grund	Projekt-Bausteine	Zusätzliche Vorteile / Synergie	Terminziel / Kostenrahmen
FW2	Erhalt Schulbetrieb – Nutzung Übungshalle/ Brandhaus FW 2 Übungshalle nur bis 2028 (statisches Gutachten)	<b>Erstellung neues Brandhaus,</b> Atemschutzstrecke und Atemschutzwerkstatt auf Gelände FW 2	Kein Interims Brandhaus/ Atemschutzwerkstatt – Gebäude wird durchgehend auch bei Neubau FRSM genutzt	2029 Brandhaus im Projekt FRSM bis 2029 zu erstellen / Kostenrahmen 14 – 15 Mio.
FW Aubing	Erhalt Schulbetrieb – FW 2 Übungshalle nur bis 2028 (statisches Gutachten)	<b>Übungsgebäude FRSM</b> als Vorabnutzung Bauteil Süd der FW Aubing	Kein Interim; Bauteil wird als Teil FW Aubing weitergenutzt; Wohnungen können als Büros zwischengenutzt werden	2029 Übungsgebäude im Projekt FRSM bis 2029 zu erstellen Kostenrahmen 42 – 45 Mio.
FW 9	Betrieb Schlauchwerkstatt (in Übungshalle FW2), zusätzlich: Sanierung Stützen der Fahrzeughalle (Gutachten: bis 2028)	<b>Schlauchwerkstatt</b> in ehem. Kleiderkammer BT A; Stützensanierung BT A mit Erweiterung der Fahrzeughalle, sowie dringende Sicherheits-, Betriebs- und Arbeitsschutz-relevante Maßnahmen BT A	Schlauchwerkstatt kann dauerhaft final eingerichtet werden, kein Provisorium notwendig; BT A wird bis zur Generalsanierung auf Stand gebracht	2028 Maßnahme BT A bis 2028 abgeschlossen s. MIP Anlage

FW Aubing Neubau

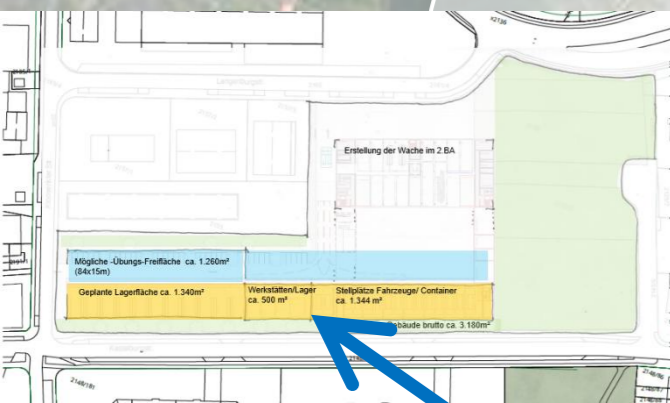

Teil-Übungshalle  
Fahrzeugstellplätze  
Teil-Schulungsräume  
Übungsfläche Freibereich

FRSM / FW 2

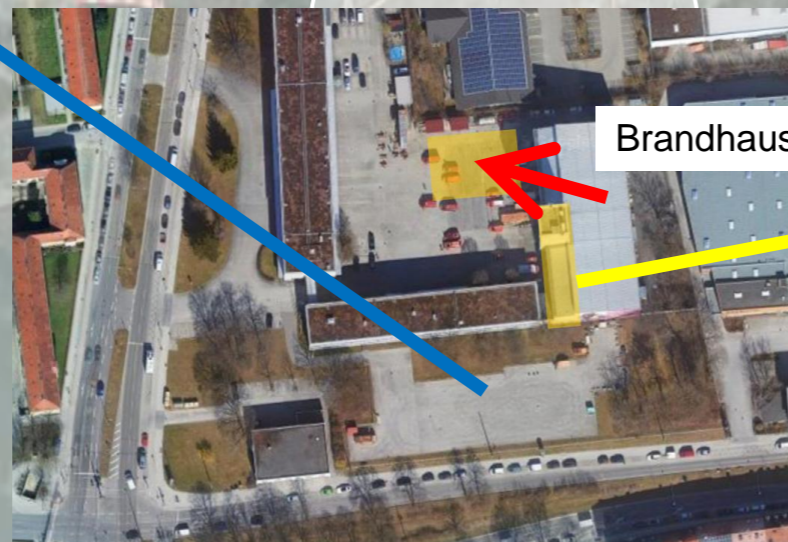

Brandhaus, ATW

Schlauchwerkstatt

FW 9 Sanierung

